




## **Relatório de Execução da Agenda Regulatória 2021-2022**

**Setembro de 2021**

## Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento

A Agenda Regulatória 2021-2022, aprovada pela Resolução Interna nº 1, de 4 de dezembro de 2020, e alterada pelas Resoluções Internas nº 9, de 2 de março de 2021, e nº 12, de 19 de abril de 2021, contém todas as ações de normatização a serem conduzidas pela Anatel no período de referência. Este instrumento de gestão busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo órgão regulador.

A Agenda vigente tem 29 itens<sup>1</sup>, sendo 9 novas iniciativas e 20 iniciativas em continuação da Agenda do biênio anterior. A Agenda 2021-2022 traz, assim como no biênio anterior, a categorização das iniciativas em temas e subtemas, bem como a priorização das ações regulatórias (classificadas como prioritárias, urgentes ou ordinárias).

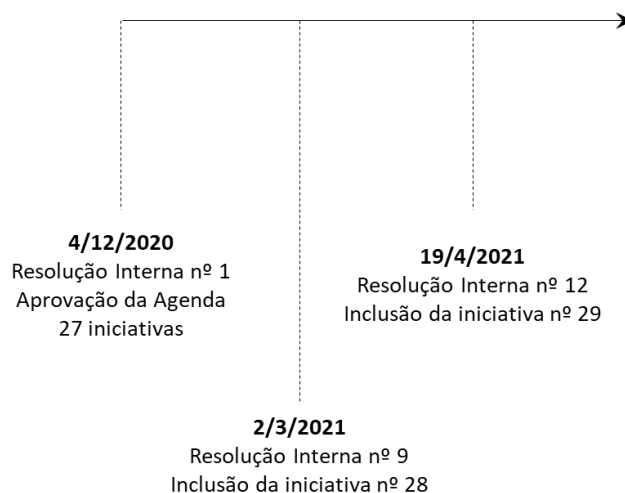

**Figura 1. Alterações da Agenda Regulatória 2021-2022 desde sua aprovação**

Entre os principais projetos destacam-se a regulamentação da adaptação das concessões do STFC para regime privado, a regulamentação sobre continuidade do STFC prestado em regime público, a reavaliação da regulamentação afeta aos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações, da regulamentação geral de uso de radiofrequências e da regulamentação geral de satélites, bem como a reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória e o Edital de Licitação para autorização de uso de faixas de radiofrequências associadas ao “5G”. Há ainda diversos projetos sobre numeração e gestão do espectro, esta última temática abrangendo atribuições, destinações, condições de uso e elaboração de edital de licitação para conferência de novas autorizações de radiofrequências, em especial em faixas que serão utilizadas por sistemas ditos “5G”. Há também diversos projetos sobre simplificação e transparência regulatória, como a simplificação dos serviços de telecomunicações e de sua regulamentação, bem como a guilhotina regulatória.

O acompanhamento da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão da Agenda. De acordo com a Resolução Interna nº 1, a Superintendência de Planejamento e Regulamentação – SPR deve elaborar semestralmente relatório de acompanhamento das iniciativas regulamentares constantes da Agenda.

<sup>1</sup> Em sua aprovação inicial, a Agenda tinha 27 itens. Posteriormente foram inseridos dois novos itens pelo Conselho Diretor (iniciativas nº 28 e nº 29).

### Do nível de execução da Agenda Regulatória


O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 2.



**Figura 2. Metodologia de cálculo do nível de execução**

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2021-2022).

Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em **40,0 % (quarenta por cento)** em 30 de setembro de 2021, conforme figura 3.

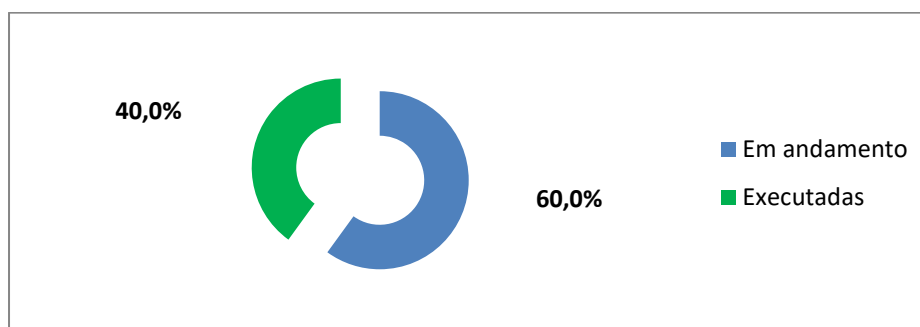


**Figura 3. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2021-2022**

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre. Neste relatório, por se referir ao terceiro trimestre de 2021, se detalhará apenas as metas do semestre já passados e do semestre corrente (ou seja, o primeiro e o segundo semestres de 2021).

#### Primeiro semestre de 2021

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2021.

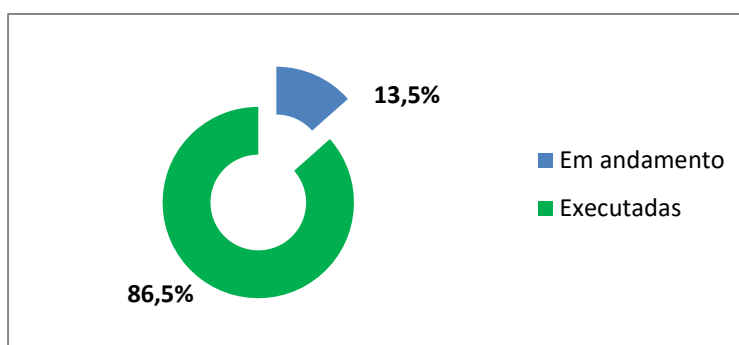

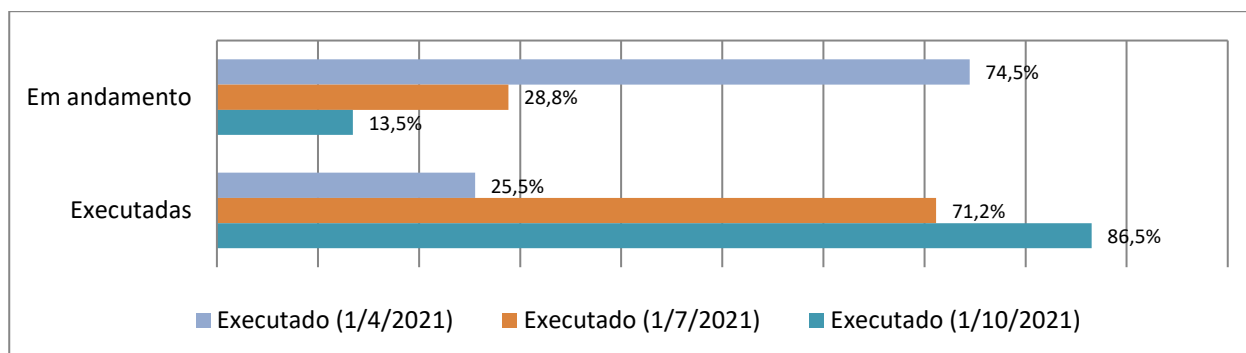


Figura 4. Nível de **execução** das iniciativas regulamentares da Agenda 2021-2022 com meta para o primeiro semestre de 2021

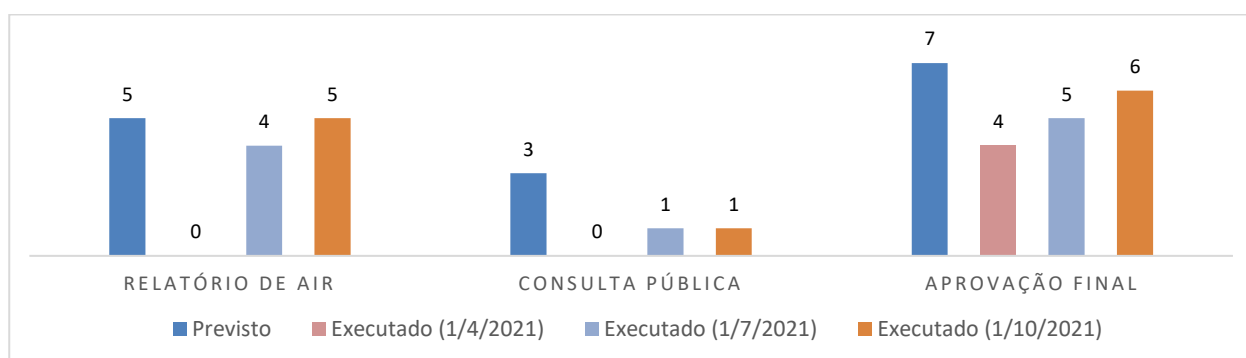


Figura 5. Execução das metas da Agenda 2021-2022 com meta para o primeiro semestre de 2021

Como se vê, em 30 de setembro de 2021, as metas para o primeiro semestre de 2021 estavam **86,5 % (oitenta e seis vírgula cinco por cento)** executadas.

Assim, para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2021, restam: (i) a aprovação de duas Consultas Públicas<sup>2</sup>; e (ii) a aprovação final de um projeto<sup>3</sup>.

### Segundo semestre de 2021

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2021.



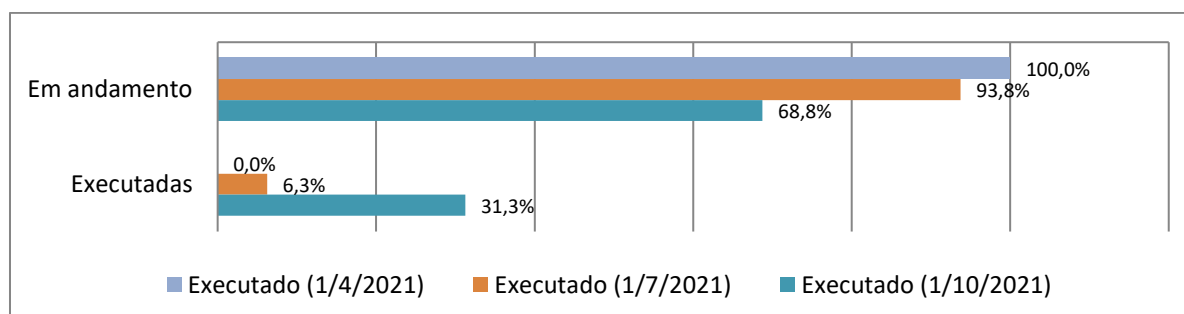


Figura 6. Nível de **execução** das iniciativas regulamentares da Agenda 2021-2022 com meta para o segundo semestre de 2021

<sup>2</sup> Iniciativas nº 9 e nº 23.

<sup>3</sup> Iniciativa nº 17.

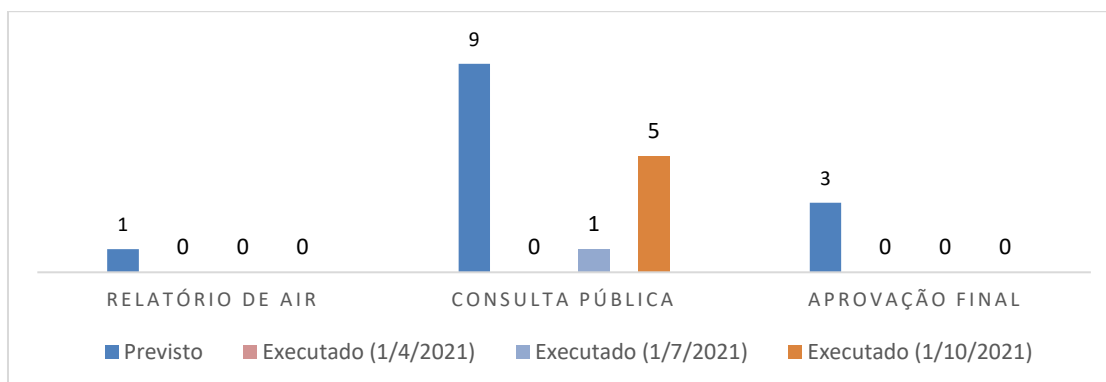

**Figura 7. Execução das metas da Agenda 2021-2022 com meta para o primeiro semestre de 2021**


Como se vê, em 30 de setembro de 2021, as metas para o segundo semestre de 2021 estavam **31,3 % (trinta e um vírgula três por cento)** executadas.

Assim, para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2021, restam: (i) a finalização de um Relatório de Análise de Impacto Regulatório e da respectiva proposta<sup>4</sup>; (ii) a aprovação de quatro Consultas Públicas<sup>5</sup>; e (iii) a aprovação final de três projetos<sup>6</sup>.

### **Do nível de conclusão da Agenda Regulatória**

A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que finalizaram a etapa de “aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.

Em 30 de setembro de 2021, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em **20,7 % (vinte vírgula sete por cento)**, conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual considera todos os 29 (vinte e nove) projetos previstos na Agenda Regulatória.

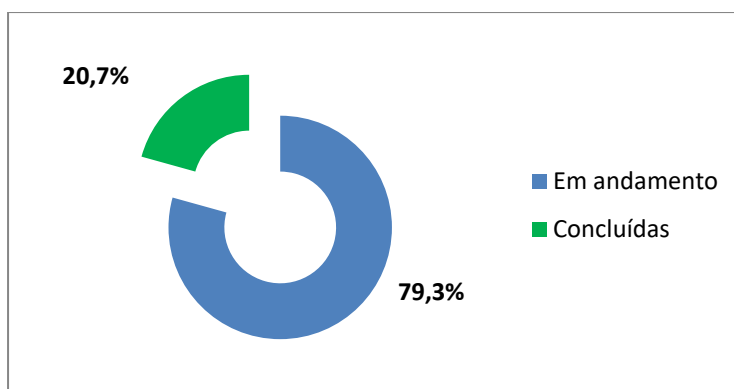

**Figura 8. Nível de conclusão das iniciativas regulamentares da Agenda 2021-2022**

Entretanto, deste total, apenas 25 (vinte e cinco) projetos tem previsão de “aprovação final” até o final de 2022. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o final de 2022, o percentual de conclusão em 30 de setembro de 2021 estava em **24,0 % (vinte e quatro por cento)**.



<sup>4</sup> Iniciativa nº 22.

<sup>5</sup> Iniciativas nº 8, nº 20, nº 21, e nº 25.

<sup>6</sup> Iniciativas nº 6, nº 14 e nº 19.

### Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência

A figura a seguir mostra a localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na Agenda Regulatória 2021-2022 em 30 de setembro de 2021.

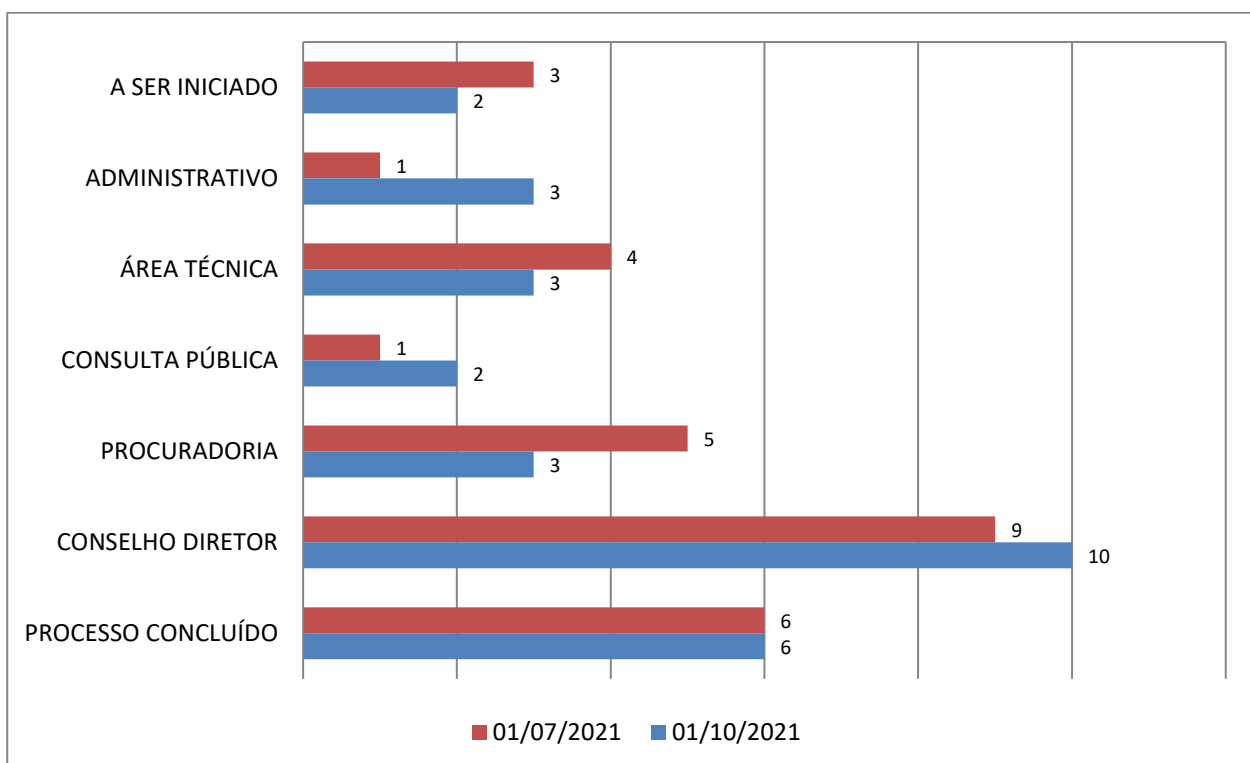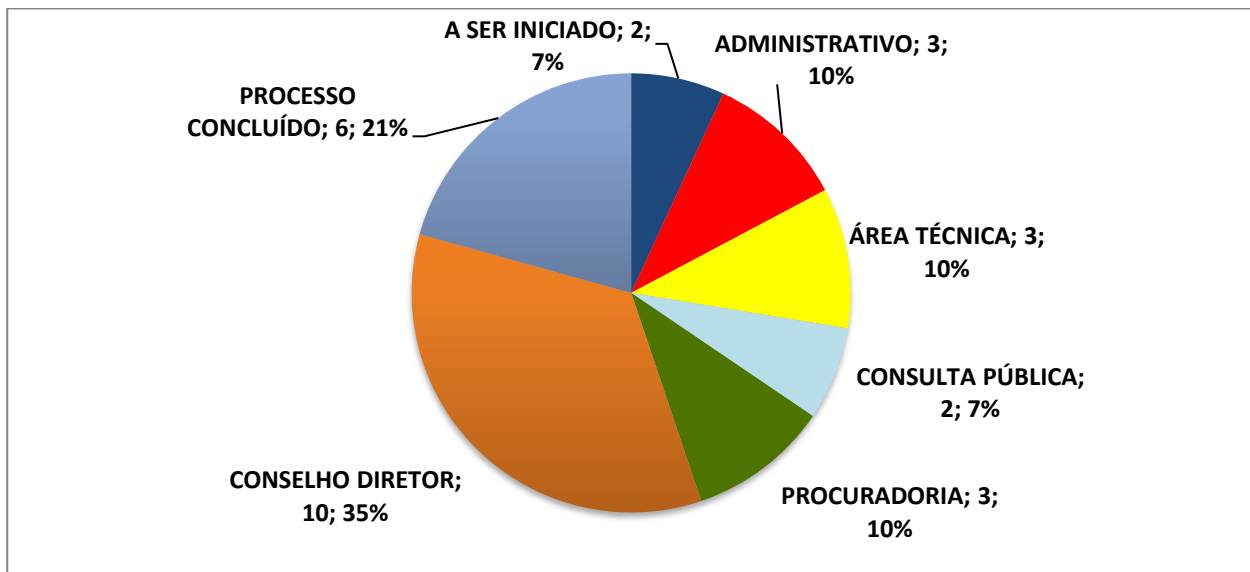

**Figura 7. Localização das ações em andamento**

Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que já estavam naquele órgão e fase no trimestre anterior; e (ii) que chegaram àquele órgão, em nova fase, deste o trimestre anterior.

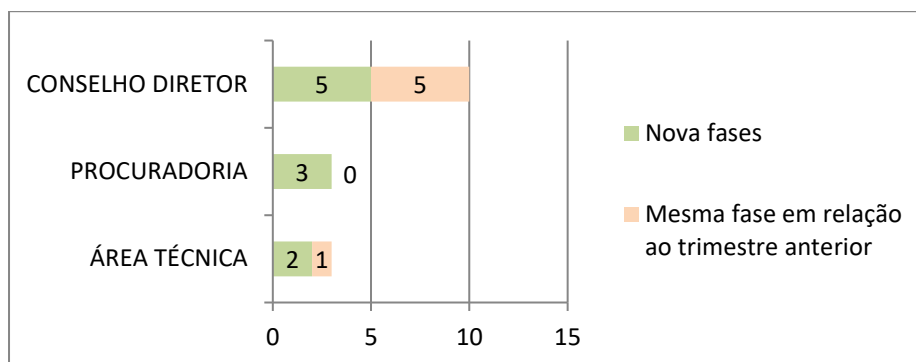


Figura 8. Localização das ações em andamento – novos processos naquelas áreas e situações em relação ao trimestre anterior<sup>7</sup>

### Da situação dos projetos da Agenda Regulatória

A figura a seguir mostra a distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2021-2022, em 30 de setembro de 2021, conforme a situação processual.

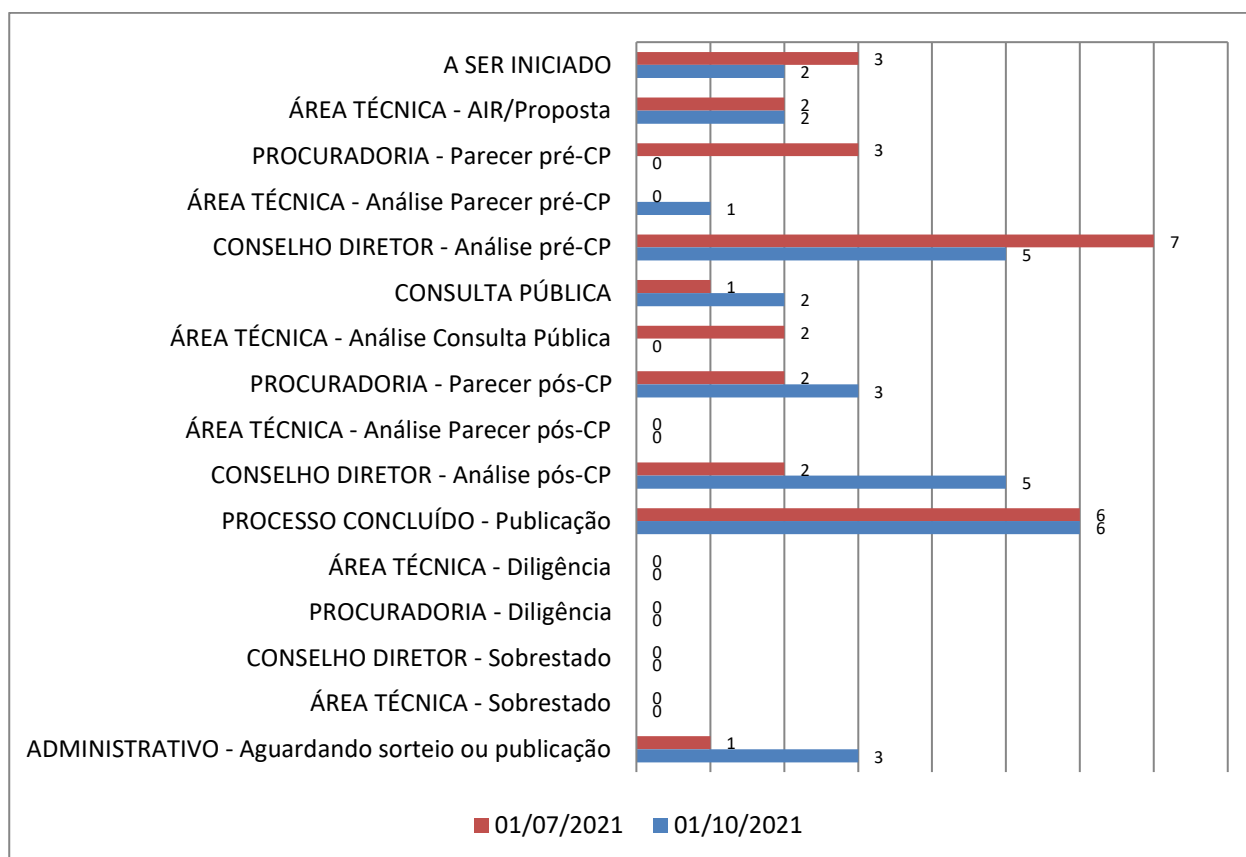


Figura 9. Distribuição das iniciativas regulamentares conforme a situação processual

### Dos prazos de cada etapa regulamentar

Ainda sobre as fases do processo de regulamentação, considerando os projetos previstos na Agenda Regulatória 2021-2022, é importante analisar a duração de cada fase. Essa avaliação permite entender possíveis gargalos do processo além de ser insumo fundamental para o


<sup>7</sup> O único processo que está na área técnica e está na mesma fase que estava no relatório trimestral anterior, encontra-se na fase de elaboração de Análise de Impacto Regulatória – AIR e proposta (iniciativa nº 10).

planejamento e dimensionamento de esforço para iniciativas regulamentares futuras quando da elaboração das Agendas Regulatórias da Agência.

Considerando apenas as fases processuais já concluídas até 30 de setembro de 2021, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 1 e figura 10.

FASE	RESPONSÁVEL	MÉDIA (ATUAL)	MÉDIA (AGENDA 19-20)	REDUÇÃO %
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	230	237	-2,6%
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	69	68	1,4%
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	52	55	-4,8%
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	181	184	-1,9%
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	57	55	3,1%
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	132	136	-2,9%
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	68	68	1,0%
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	53	56	-5,1%
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	125	119	5,8%

**Tabela 1. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas<sup>8</sup>**

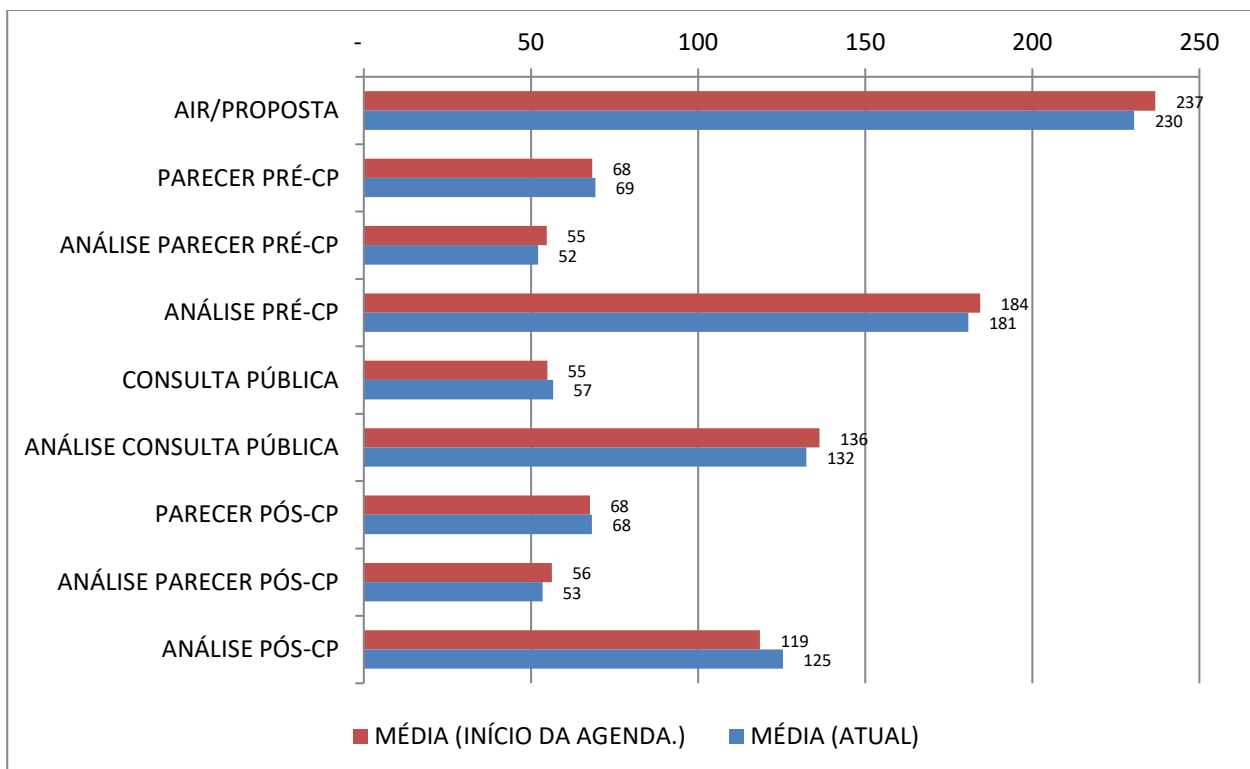


**Figura 10. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas**

Ainda com relação aos prazos das fases já concluídas, abaixo são apresentados os gráficos de dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar, bem como o prazo médio ano a ano (considerando as fases encerradas naquele ano).

<sup>8</sup> Consideradas apenas as fases processuais iniciadas depois de 2013, ano da reestruturação da Anatel, e concluídas até 30 de junho de 2021 em cada processo regulamentar. Informações obtidas a partir dos sistemas interativos SEI e SICAP.


### Área técnica – relatório de AIR e proposta

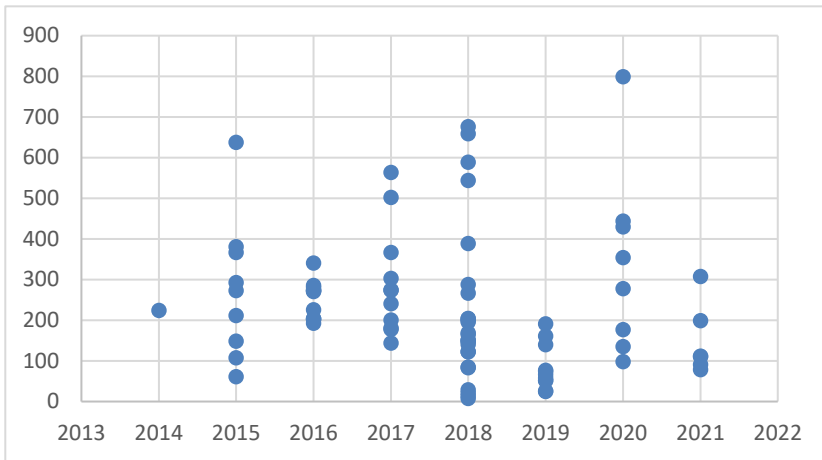

MÉDIA	230
MÍNIMO	8
MÁXIMO	799

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	224
2015	9	276
2016	12	252
2017	11	294
2018	25	225
2019	11	84
2020	8	339
2021	6	150


### Procuradoria – Parecer pré-CP

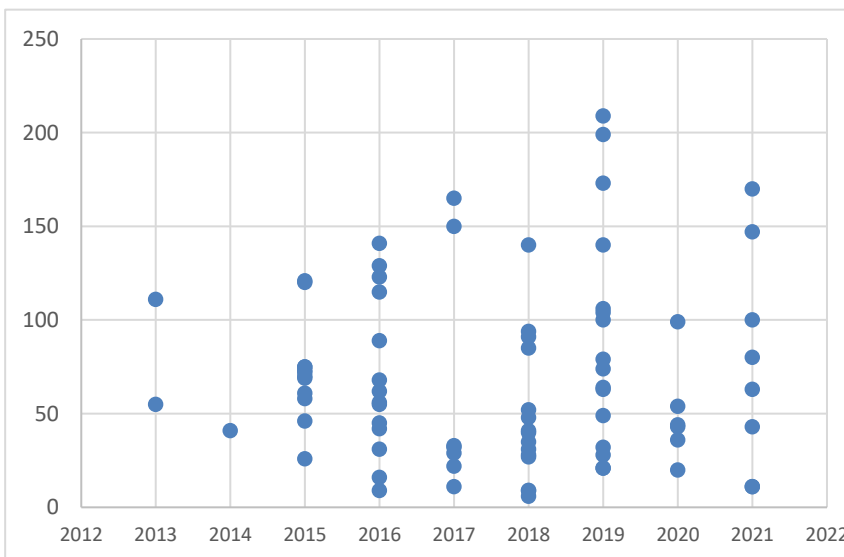

MÉDIA	69
MÍNIMO	6
MÁXIMO	209

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	2	83
2014	1	41
2015	12	72
2016	14	70
2017	7	63
2018	15	49
2019	16	91
2020	6	49
2021	8	78


### Área técnica – análise do Parecer pré-CP

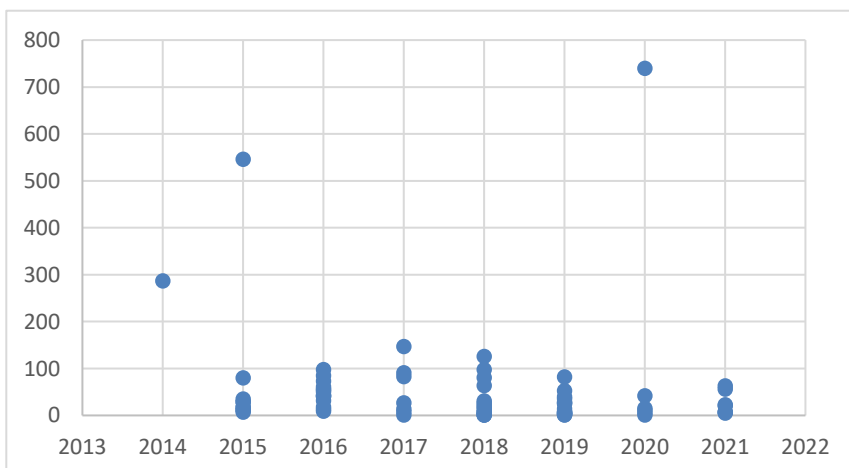

MÉDIA	52
MÍNIMO	1
MÁXIMO	740

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	287
2015	10	79
2016	14	48
2017	7	53
2018	15	34
2019	16	21
2020	6	136
2021	7	26


### Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de Consulta Pública

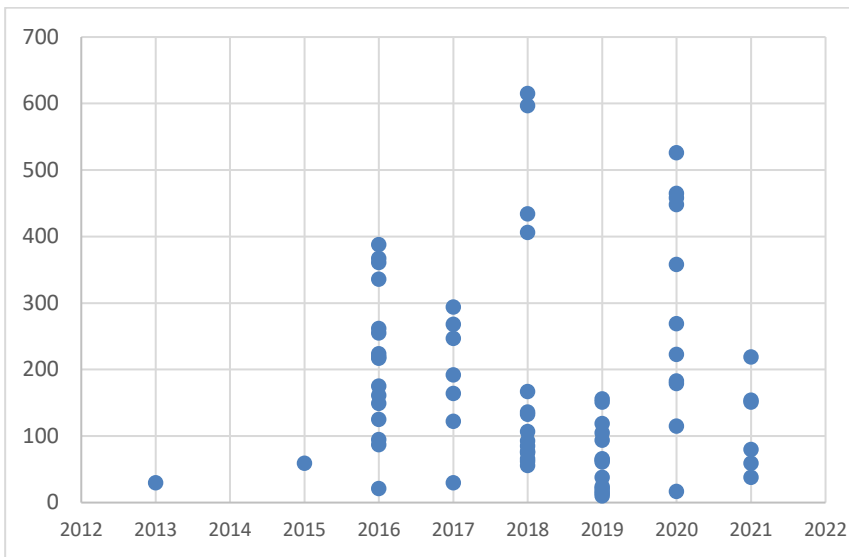

MÉDIA	181
MÍNIMO	10
MÁXIMO	615

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	30
2014	0	0
2015	1	59
2016	16	215
2017	7	188
2018	15	207
2019	14	67
2020	11	295
2021	6	117


### Consulta Pública

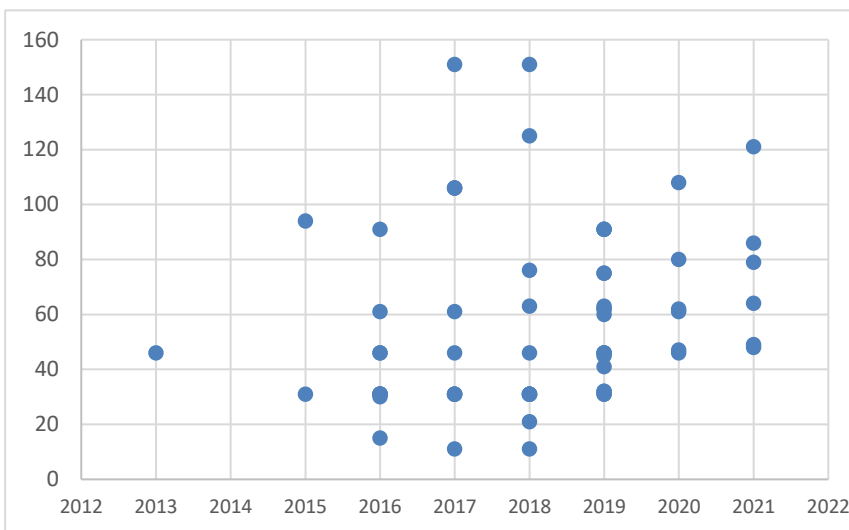

MÉDIA	57
MÍNIMO	11
MÁXIMO	151

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	46
2014	0	0
2015	2	63
2016	13	39
2017	11	65
2018	12	54
2019	18	57
2020	6	67
2021	6	75


### Área técnica – análise da Consulta Pública e nova proposta

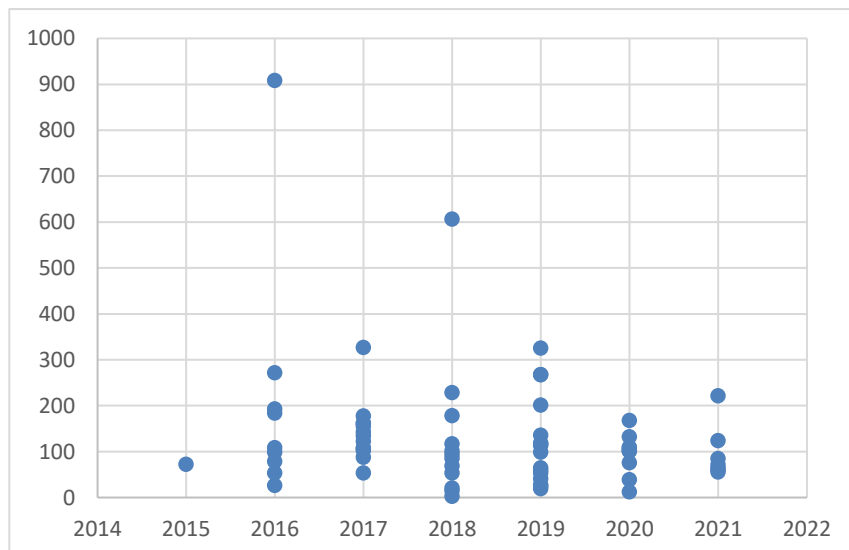

MÉDIA	132
MÍNIMO	3
MÁXIMO	909

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	1	73
2016	9	214
2017	13	142
2018	12	131
2019	16	121
2020	10	96
2021	7	98


### Procuradoria – Parecer pós-CP

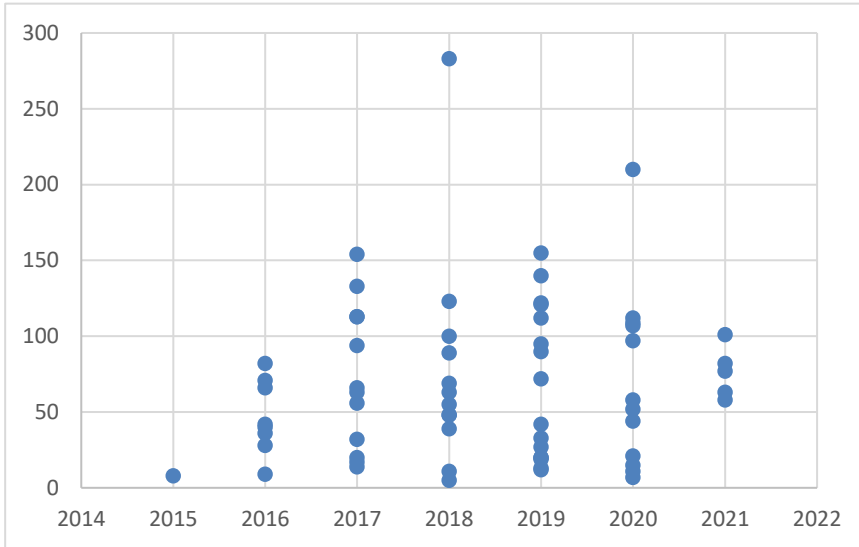

MÉDIA	68
MÍNIMO	5
MÁXIMO	283

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	1	8
2016	8	47
2017	12	73
2018	12	78
2019	16	68
2020	12	70
2021	5	76


### Área técnica – análise do Parecer pós-CP

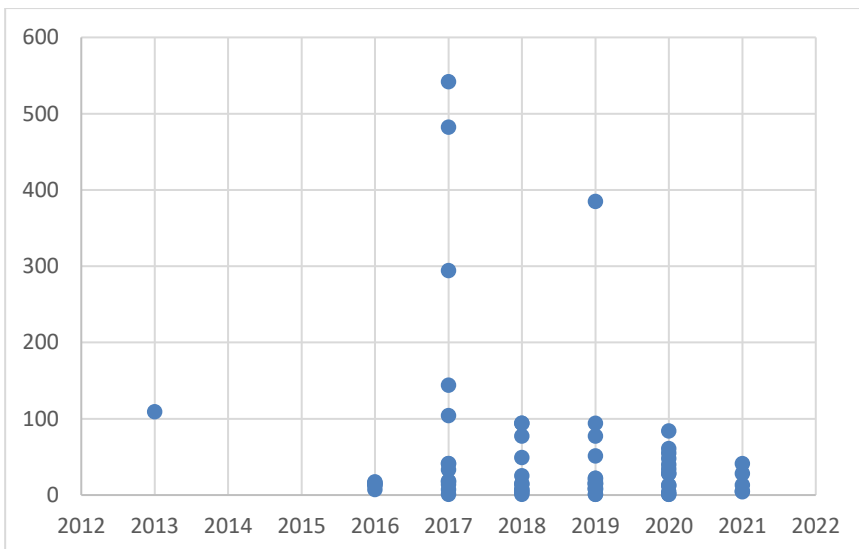

MÉDIA	53
MÍNIMO	1
MÁXIMO	542

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	109
2014	0	0
2015	0	0
2016	6	14
2017	13	134
2018	12	33
2019	17	45
2020	13	31
2021	5	18

### Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de aprovação final

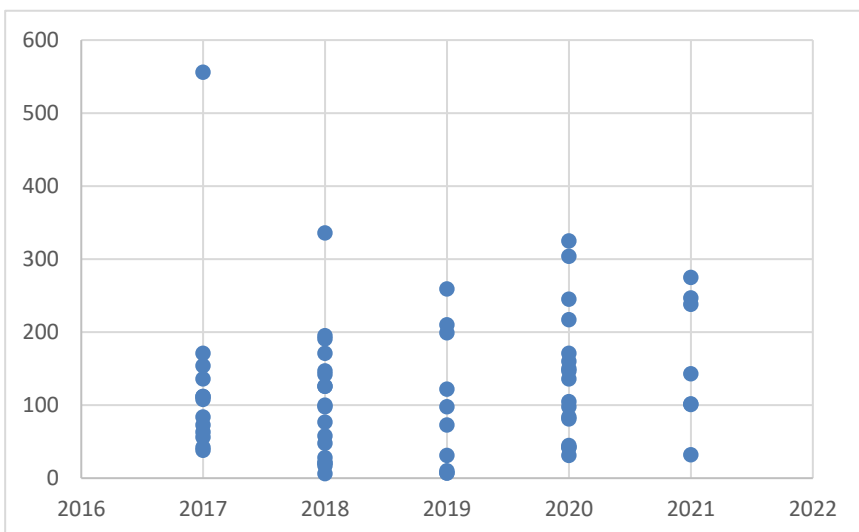

MÉDIA	125
MÍNIMO	6
MÁXIMO	556

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	13	131
2018	18	106
2019	10	102
2020	17	140
2021	7	163

Figura 11. Dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar e prazo médio<sup>9</sup>

<sup>9</sup> As médias de prazo consideram tão somente os projetos de regulamentação constantes nas Agendas Regulatórias a partir de 2015. Para estas propostas foram consideradas apenas as fases processuais iniciadas

Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 30 de setembro de 2021, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 2.

FASE	RESPONSÁVEL	PROCESSOS	MÉDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO	-	2	NA
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	2	157
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	-	-
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	1	14
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	5	196
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	2	29
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	-	-
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	3	24
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	-	-
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	5	61
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	3	1
DILIGÊNCIA	ÁREA TÉCNICA	-	-
DILIGÊNCIA	PROCURADORIA	-	-
CONCLUÍDO	-	6	NA

**Tabela 2. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases em andamento**

## ANEXO I

### Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2021-2022 em 30 de setembro de 2021

PROCESSO	2021-2022	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2021)	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022
					META	META	META	META
53500.056574/2017-14	1	Regulamentação da adaptação das concessões do STFC para regime privado.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-
53500.004083/2018-79	2	Edital de Licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações, inclusive por meio de redes ditas de quinta geração (5G), em áreas de abrangência regionais ou nacional.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-
53500.024725/2019-37	3	Edital de Licitação de Direitos de Exploração de Satélites Brasileiros.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-
53500.056388/2017-85	4	Reavaliação da regulamentação sobre continuidade do STFC prestado em regime público, inclusive no que diz respeito aos bens reversíveis.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-
53500.078752/2017-68	5	Reavaliação da regulamentação relacionada a serviços públicos de emergência e à segurança de redes de telecomunicações.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-
53500.061949/2017-68	6	Reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de telecomunicações.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	-	Aprovação final	-	-
53500.205186/2015-10	7	Reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final	-	-	-

PROCESSO	2021-2022	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2021)	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022
53500.012166/2019-12	8	Revisão do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC).	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	-	Consulta Pública	-	Aprovação final
53500.014686/2018-89	9	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	Consulta Pública	-	Aprovação final	-
53500.055615/2020-51	10	Reavaliação da regulamentação de mercados relevantes (PGMC), em especial a aprovada por meio da Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, e atualizado pela Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	-	-	Relatório de AIR e proposta	-
53500.071899/2020-22	11	Reavaliação da regulamentação de Exploração de Linha Dedicada - EILD, em especial a aprovada por meio da Resolução nº 590, de 15 de maio de 2012.	00 - Projeto a ser iniciado	00 - Projeto a ser iniciado	-	-	-	Relatório de AIR e proposta
53500.071900/2020-19	12	Revisão das áreas de tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC, além da revisão quinquenal das áreas locais do mesmo serviço.	08 - Consulta Pública	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	Relatório de AIR e proposta	Consulta Pública	Aprovação final	-
53500.071901/2020-63	13	Reavaliação das taxas e contribuições aplicáveis ao setor de telecomunicações.	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	Relatório de AIR e proposta	-	Consulta Pública	-
53500.059950/2017-22	14	Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações - Numeração de Serviços	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	-	Aprovação final	-	-
53500.054797/2018-28	15	Regulamentação para utilização do espectro ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas faixas de VHF e UHF.	07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	Aprovação final	-	-	-

PROCESSO	2021-2022	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2021)	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022
53500.012170/2019-81	16	Regulamentação das faixas de 4800-4990 MHz.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	08 - Consulta Pública	-	Consulta Pública	-	Aprovação final
53500.012171/2019-25	17	Atualização das atribuições e destinações decorrentes de decisões da Conferência Mundial de 2019 (PDF 2021).	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator	Aprovação final	-	-	-
53500.012172/2019-70	18	Revisão da regulamentação de uso de radiofrequências associadas à prestação do STFC, SCM e SMP.	07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	-	Consulta Pública	-	Aprovação final
53500.012173/2019-14	19	Regulamento Geral de Satélites.	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	-	Aprovação final	-	-
53500.012178/2019-47	20	Revisão do Regulamento de Uso do Espectro (RUE).	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	-	Consulta Pública	-	Aprovação final
53500.071902/2020-16	21	Reavaliação da regulamentação sobre Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações (BSR), em especial a aprovada pela Resolução nº 308, de 11 de setembro de 2002.	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	Relatório de AIR e proposta	Consulta Pública	Aprovação final	-
53500.071903/2020-52	22	Atualização das atribuições e destinações do Plano de Distribuição de Faixas de Frequências (PDF 2022).	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	00 - Projeto a ser iniciado	-	Relatório de AIR e proposta	Consulta Pública	Aprovação final
53500.052390/2017-85	23	Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	Consulta Pública	-	Aprovação final	-

PROCESSO	2021-2022	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2021)	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022
53500.017117/2019-76	24	Reavaliação da estrutura e regimento interno das Comissões Brasileiras de Comunicações – CBCs.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	Consulta Pública	-	Aprovação final	-
53500.059638/2017-39	25	Simplificação da regulamentação e dos serviços de telecomunicações.	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	-	Consulta Pública	-	Aprovação final
53500.012180/2019-16	26	Revogação de normativos (guilhotina regulatória).	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	-	-	Aprovação final	-
53500.071905/2020-41	27	Internalização e consolidação de Normas e Resoluções de organismos internacionais	00 - Projeto a ser iniciado	00 - Projeto a ser iniciado	-	-	Relatório de AIR e proposta	-
53500.003997/2021-18	28	Reavaliação da regulamentação de operacionalização da aplicação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST	08 - Consulta Pública	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	Relatório de AIR e proposta	Consulta Pública	Aprovação final	-
53500.015622/2021-09	29	Reavaliação da regulamentação sobre operacionalização das metas de universalização e consolidação dos diversos normativos sobre o tema	07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	Relatório de AIR e proposta	Consulta Pública	Aprovação final	-

#### LEGENDA

	Ação concluída ou meta intermediária executada
	Meta intermediária parcialmente executada
	Meta intermediária não executada

<b>FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO</b>
00 – Projeto a ser iniciado
01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
02 - Consulta Interna
03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica
04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator
06 - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública
06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)
07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)
08 - Consulta Pública
09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE
12 - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica
12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
13 - Processo concluído
97 - Diligência da PFE à área técnica
98 - Diligência do CD à Procuradoria
99 - Diligência do CD à área técnica
